

キャンプおおさか 治水のための川作り作業
第1期工事

時：令和6年2月10日（土）～12日（月・祝）

場所：シャワー場伐開地域～第4サイト

3日間の第1期工事で、当初目標には少し届きませんでしたが、第4サイト内の暗渠やパイプの埋設とEサイトの整地が終わり、第4サイト内の掘削と水路の最初の部分ができました。


休日を返上したチーム員と近大ローバースの皆様ありがとうございました。

次回第2期工事は、3月16日（土）・17日（日）の予定です。

第1日

参加者：野営場整備チーム員9人（内 近大RS2人）

作業内容：部材の準備・明日からの工事の下準備・薪割り場建屋の仮組

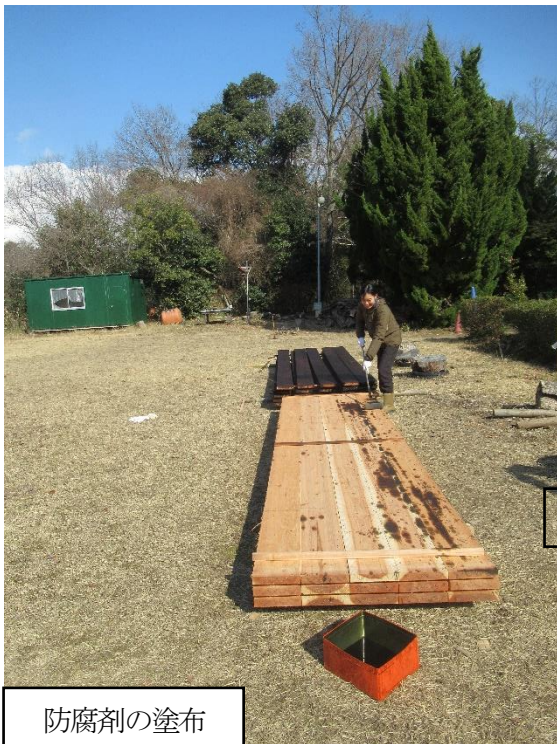

防腐剤の塗布



部材の準備



堰設置



参加の近大RSと宮本チーフ



伐開地の拡張

第2日

参加者：野営場整備チーム員14人（内 近大RS7人）

作業：第4サイトEサイトの暗渠とパイプ埋設



伐採物の集積



砂利運搬



ユンボでの掘削



移動



パイプ埋設



暗渠作り



手掘り



参加の皆さん

第3日

参加者：野営場整備チーム員10人（内 近大RS4人）

作業：第4サイトEサイトの暗渠とパイプ埋設及びサイト内整地
Eサイト前水路製作と川下の掘削



Eサイト南側パイプ埋設



水路の側壁完成



水路手掘り



堰作り



施工後、整地されたEサイト



掘削した川下
